

令和6年度公共事業再評価調書

担当課名

街路整備課

番号	50																			
事業名	街路整備事業		事業主体	静岡県																
箇所名	としけいかくどうろ にしまかどあらやせん こうく 都市計画道路 西間門新谷線 (4工区)		関係市町	駿東郡清水町																
事業採択年度	平成 22 年度		計画期間	平成 22 年度 ~ 令和 8 年度																
用地着手年度	平成 22 年度		工事着手年度	平成 24 年度																
再評価理由※	再評価実施(R1)後5年間が経過した時点で継続中																			
全体事業費	百万円	投資状況 (百万円)	~R4年度	R5年度	R6年度見込	計														
	2,228		1,697	202	134	2,033														
事業概要	(1)事業目的																			
	<p>・沼津市、清水町及び三島市の2市1町の広域的な幹線道路としての役割を担う本路線は、慢性的に渋滞が発生するほか、歩道が狭く危険な状況である。また、電柱が林立し、災害時のアクセスが困難になることも懸念される。</p> <p>・道路拡幅、無電柱化を行うことで、交通の円滑化、歩行者・自転車の安全確保及び災害時のアクセス機能向上等を図る。</p>																			
事業概要	(2)事業内容																			
	<p>施工延長： 400 m 道路幅員： 18 m</p> <p>車道拡幅工： 400 m 車線数： 2 車線</p> <p>電線共同溝工： 400 m</p>																			
【視点1】	(1)事業を巡る社会経済情勢等の変化																			
	<p>・本路線の周辺では、公共施設、医療施設が整備されており、近年、大型商業施設等の集客施設(令和2年3月「サントムーン オアシス」増床、令和2年7月「まほろば館」(図書館・保健センター複合施設)開業、令和5年4月スーパーマーケット開業)が整備されるなど、都市化が進展。</p> <p>・県全体の人口が減少する中で、清水町の人口は横ばい傾向にあり、世帯数が増加。</p>																			
事業の必要性	(2)事業の投資効果																			
	<p>○費用便益分析結果 (令和 6 年度時点)</p> <table border="1"> <tr> <th>B/C (i=4%)</th> <th>参考:B/C (i=2%)</th> <th>参考:B/C (i=1%)</th> <th>EIRR</th> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>2.1</td> <td>3.1</td> <td>4.7%</td> </tr> </table> <p>・総便益(B) 32.9億円 (時間便益 29.94億円、経費便益 2.54億円、交通便益 0.46億円)</p> <p>・総費用(C) 28.2億円 (建設費28.82億円、維持管理費 0.18億円、用地残存価値 0.81億円)</p> <p>○見込まれる効果(定性的な効果)</p> <p>・交通の円滑化 ・歩行者・自転車の安全確保 ・災害時のアクセス機能向上 ・景観の向上</p>					B/C (i=4%)	参考:B/C (i=2%)	参考:B/C (i=1%)	EIRR	1.2	2.1	3.1	4.7%							
B/C (i=4%)	参考:B/C (i=2%)	参考:B/C (i=1%)	EIRR																	
1.2	2.1	3.1	4.7%																	
事業の必要性	(3)事業の進捗状況 (令和 6 年度見込み)																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>進捗率</th> <th colspan="2">内 訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>91.2%</td> <td>(2,033 百万円</td> <td> / 2,228 百万円)</td> </tr> <tr> <td>事業量</td> <td>0.0%</td> <td>(0 m</td> <td> / 400 m)</td> </tr> <tr> <td>用地取得</td> <td>100.0%</td> <td>(4,462 m²</td> <td> / 4,462 m²)</td> </tr> </tbody> </table> <p>評価 継続が妥当</p>					区分	進捗率	内 訳		事業費	91.2%	(2,033 百万円	/ 2,228 百万円)	事業量	0.0%	(0 m	/ 400 m)	用地取得	100.0%	(4,462 m ²
区分	進捗率	内 訳																		
事業費	91.2%	(2,033 百万円	/ 2,228 百万円)																	
事業量	0.0%	(0 m	/ 400 m)																	
用地取得	100.0%	(4,462 m ²	/ 4,462 m ²)																	
【視点2】 今後の事業の進捗の見込み	用地取得は完了し、整備に対する地元の期待も高いことから、引き続き事業進捗を図ることで、計画期間内の完成が見込まれる。																			
	評価 継続が妥当																			
【視点3】 新たなコスト削減・代替案立案等の可能性	建設発生土の工事間流用(近隣の他工事)を実施するなど、工事コストの削減を図る。																			
対応方針(案)	(1)対応方針(案)																			
	<p>本事業を 【 継続 】 する。</p>																			
対応方針(案)	(2)理由																			
	<p>用地取得は完了するなど事業は進捗しており、整備に対する地元の期待も高く、都市交通の円滑化、歩行者や自転車の安全確保、災害時のアクセス向上など多様な効果も期待されることから、事業を継続する。</p>																			

費用便益比算出説明書

都市計画道路 西間門新谷線 (第4工区)

(「費用便益分析マニュアル」国土交通省道路局 都市局 令和5年12月)

総括表

総便益 B	[街路事業を実施しない場合の経費] - [街路事業を実施した場合の経費]	3,294百万円
総費用 C	[建設投資額] + [維持管理費] + [道路構造物更新費] - [用地残存価値]	2,819百万円
B / C		1.17

総便益

○街路事業の有無による経費の差分
 供用後50年間を評価期間としているため基準年の年間経費に各年の割引率をかけ、便益を算出し、当該道路を整備しなかった場合と整備した場合の差を求め、総便益とする。

総便益

B = 街路事業によって発生する経費に対して、整備前後の差分
 = 1,055,101百万円 - 1,051,807百万円
 = 3,294百万円

※「走行時間短縮便益」:道路の整備により短縮された総走行時間の価値
 「走行経費減少便益」:道路の整備により減少した走行経費(燃料費、タイヤ費、車両整備費等)
 「交通事故減少便益」:道路の整備により減少した交通事故による社会的損失(人的・物的損害額、事故渋滞による損失額)
 表示桁数の関係で、計算値と一致しないことがある。

※1 交通需要推計の適用年次

※2 交通事故減少便益は「費用便益分析マニュアル(国土交通省)」の算定式により算出しており、条件によってはマイナス値になることもあるが、交通事故増加に繋がるものではない。

総費用

○建設投資額
 建設費用を算出基準年次の価値で評価するために各年度ごとに割引率をかけ、合計する。

○維持管理費
 整備延長に対する年間維持管理費用に割引率をかけ、供用後50年間を合計する。

○更新費
 評価対象期間末までに耐用年数等に達する構造物がある場合に計上する。

○用地の残存価値
 評価期間後の残存価値を現在価値化したもの。


総費用

C = Σ 各年事業建設費 / (1+0.04)ⁿ + Σ 年間維持管理費 / (1+0.04)ⁿ
 + Σ 更新費 / (1+0.04)ⁿ - 用地の残存価値 / (1+0.04)ⁿ
 = 2,882百万円 + 18百万円 + 0百万円 - 81百万円
 = 2,819百万円

3. 事業概要

前回からの変更点・理由

区分	前回(R元)	今回(R6)	主な変更理由
①計画期間	H22～R3	H22～R8 (+5年)	・用地取得に時間を要したため
②全体事業費	1,800百万円	2,228百万円 (+24%)	・材料費、人件費等が上昇したため

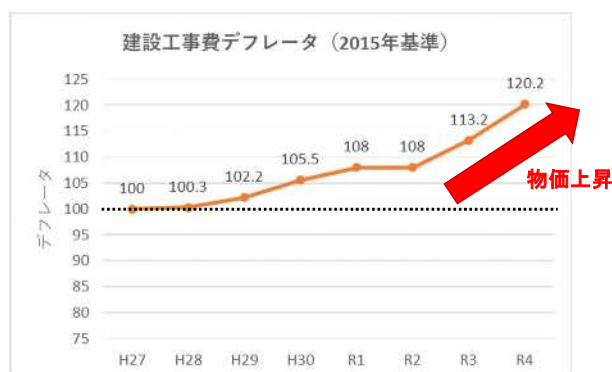

【出典：国土交通省 建設工事費デフレーター 年度次 R6.4.30】

4. 対応方針（案）

本事業は、

- ・ 道路拡幅、歩道設置、無電柱化を行うことで、交通の円滑化、歩行者・自転車の安全確保及び災害時のアクセス機能向上などを図る。
- ・ 用地取得は完了するなど事業は進捗しており、整備に対する地元の期待も高く、多様な効果も期待される。
- ・ 費用便益比は(B/C)は、1.2である。

以上から、事業効果が大きい。

事業を継続する
